



Mode d'emploi

Logiciel de gestion de chantier

Version 0.3 · 8 octobre 2026

Lachat Construction Sàrl

Ce guide couvre les modules disponibles à ce jour : adresses, catalogue, éléments de coûts, projets, devis, rapports journaliers, régie et contrôle des heures. Il sera complété à chaque livraison.

Les captures d'écran montrent des données d'exemple fictives.

Sommaire

1. Avant de commencer	3
2. Se connecter	4
3. L'écran en un coup d'œil	5
4. Les gestes communs à toutes les pages	7
5. Les adresses	8
6. Le catalogue d'articles et les modèles d'étapes	9
7. Les éléments de coûts	10
8. Les projets	11
9. Les devis	14
10. Les rapports journaliers	20
11. Les collaborateurs et les types de travail	24
12. La régie : brut, régie, client	25
13. Le contrôle des heures	27
14. Utilisateurs et rôles	29
15. Les modules à venir	30
16. Aide-mémoire	31

1. Avant de commencer

Le logiciel de gestion de chantier est une application web : il s'utilise dans un navigateur, sans rien installer. Il reprend votre façon de travailler avec BauBit (projets, devis, rapports, régie) dans une interface plus rapide.

Ce dont vous avez besoin

- Un navigateur récent : Chrome, Edge ou Firefox. Un écran d'au moins 1280 pixels de large est conseillé.
- L'adresse du logiciel et vos identifiants personnels, communiqués par votre administrateur.
- Une connexion internet.

Trois rôles

Chaque utilisateur a un rôle, qui détermine ce qu'il voit.

Rôle	Accès
Administrateur	Tout le logiciel, y compris la gestion des utilisateurs et la configuration.
Responsable	Projets, devis, rapports, régie, contrôle des heures, adresses, catalogue, éléments de coûts : tout ce qui touche aux prix et aux marges.
Ouvrier	Consultation des projets et saisie de ses rapports journaliers (heures, matériel, photos). Il ne voit jamais les prix, les marges, les devis ni la régie.

L'ordre de travail


Le logiciel suit le déroulement d'un chantier :

1. **Le projet** : vous créez le chantier, avec son client et son adresse.
2. **Le devis** : juste après, vous choisissez les étapes du chantier à partir de modèles, puis vous chiffrez.
3. **Les rapports journaliers** : les heures et le matériel se saisissent sur les étapes du devis.
4. **La régie et le contrôle des heures** : chaque ligne de rapport reçoit son prix brut, son prix régie et son prix client ; les heures de chaque collaborateur se vérifient mois par mois.
5. **La facture** : elle s'appuiera sur le devis et les rapports validés.

À savoir Les étapes 1 à 4 sont disponibles aujourd'hui. Les acomptes, les factures et les statistiques arrivent dans la prochaine livraison (voir le chapitre 15).

2. Se connecter

1. Ouvrez l'adresse du logiciel dans votre navigateur.
2. Saisissez votre **email** et votre **mot de passe**, puis cliquez sur **Se connecter**.
3. Vous arrivez sur la page d'accueil.

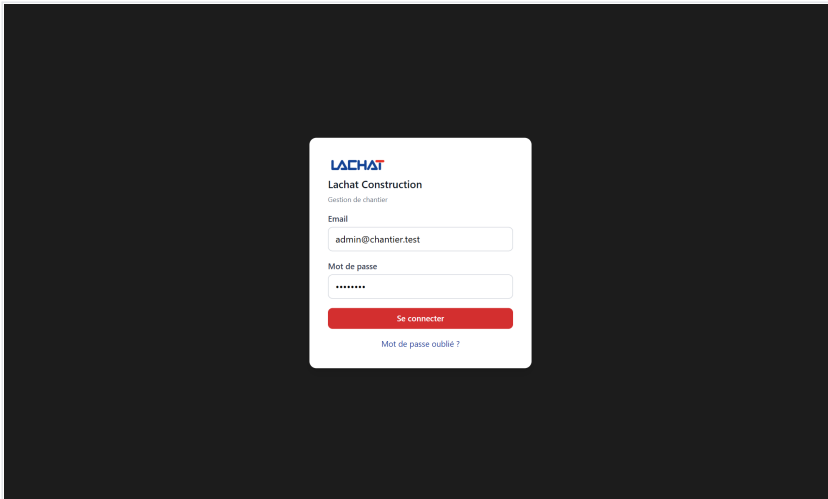

La page de connexion.

Mot de passe oublié

Cliquez sur **Mot de passe oublié ?**, saisissez votre email : vous recevez un lien pour choisir un nouveau mot de passe.


Se déconnecter

Cliquez sur l'icône de sortie, tout à droite de l'en-tête, à côté de votre nom. Pensez-y sur un poste partagé.

À savoir Après plusieurs tentatives infructueuses, la connexion est bloquée une minute. C'est une protection contre les essais de mots de passe.

3. L'écran en un coup d'œil

Toutes les pages sont construites de la même façon. Une fois ces repères connus, vous vous retrouvez partout.

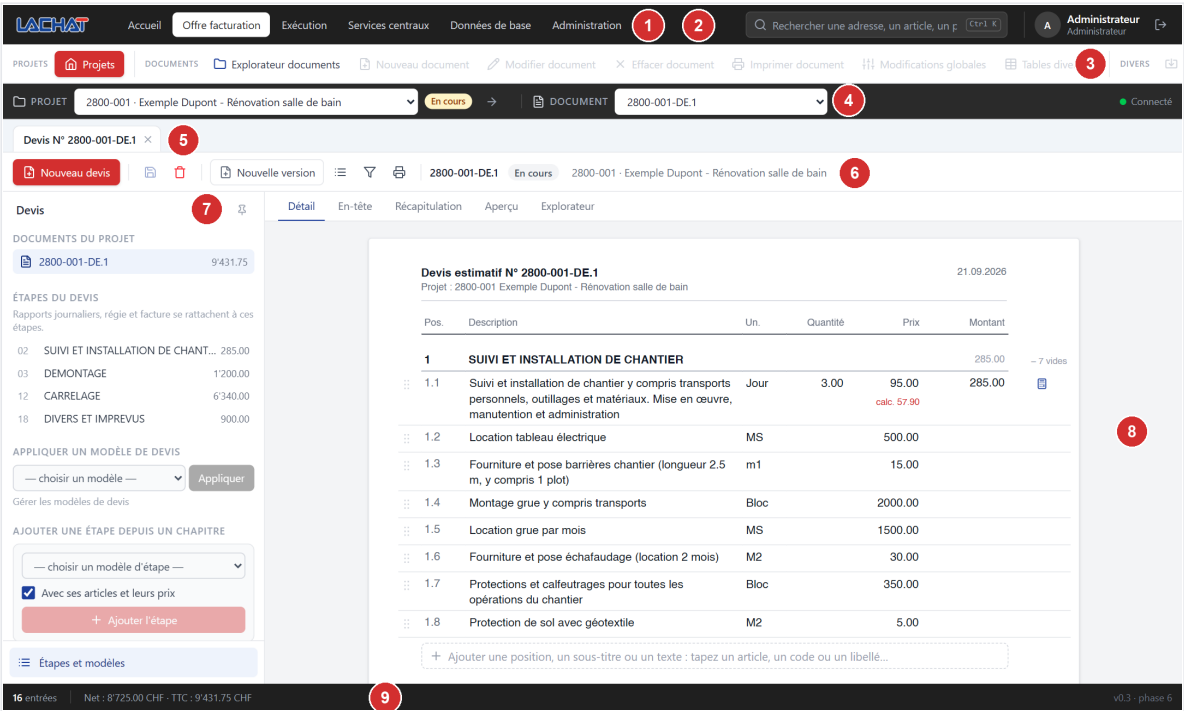


Les neuf zones de l'écran, ici sur un devis.

N°	Zone	À quoi elle sert
1	Onglets du menu	Les grandes familles : Accueil, Offre facturation, Exécution, Services centraux, Données de base, Administration.
2	Recherche	Retrouve un projet, un devis, une adresse, un article ou un prix (chapitre 4).
3	Barre d'actions	Les fonctions de l'onglet choisi. Le bouton rouge est la fonction principale. Les fonctions grisées arrivent plus tard.
4	Projet et document courants	Le chantier sur lequel vous travaillez. Les pages s'y rattachent automatiquement.
5	Onglets ouverts	Chaque page visitée reste ouverte ici. Cliquez pour y revenir, sur la croix pour la fermer.
6	Barre d'outils	Nouveau, enregistrer, annuler, supprimer, et les outils propres à la page.
7	Panneau latéral	Résumé, étapes ou arborescence selon la page. La punaise le masque pour gagner de la place.
8	Zone de travail	La fiche en cours et la liste.
9	Barre d'état	Nombre d'entrées, totaux (brut, régie, client, heures...), et l'état de l'enregistrement.

La page d'accueil

Elle affiche le nombre de projets actifs par statut, le parcours d'un chantier, un accès direct à chaque module et l'avancement du développement.

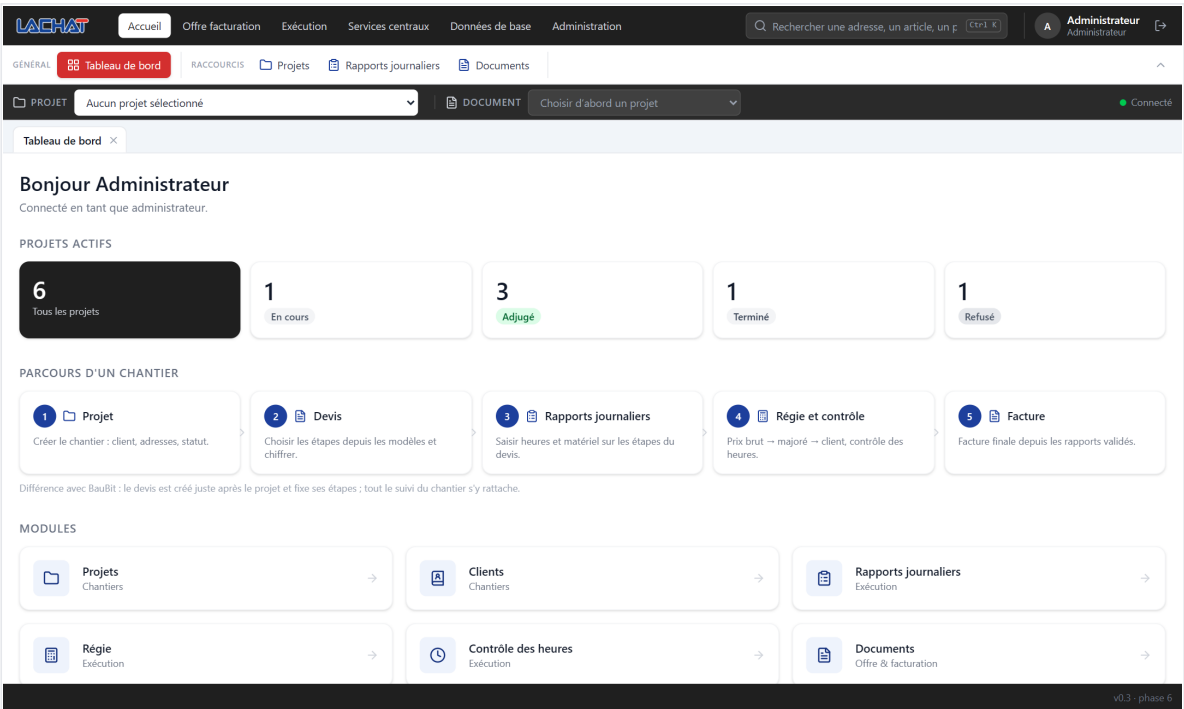

La page d'accueil.

4. Les gestes communs à toutes les pages

L'enregistrement est automatique

Vous n'avez pas de bouton « Enregistrer » à ne pas oublier. Une fiche existante s'enregistre toute seule :

- un peu plus d'une seconde après votre dernière frappe ;
- dès que vous quittez la fiche ;
- ou immédiatement avec **Ctrl + S**.

La barre d'état, en bas à droite, indique **Modifications non enregistrées, Enregistrement...** puis **Enregistré**. Une **nouvelle** fiche est créée quand vous quittez le formulaire ou appuyez sur Ctrl + S, une fois les champs obligatoires remplis.


Astuce La flèche courbe de la barre d'outils annule les modifications qui ne sont pas encore enregistrées.

Filtrer et trier une liste

- Sous chaque titre de colonne, une case **Filtrer...** : tapez quelques lettres, la liste se réduit. Vous pouvez filtrer plusieurs colonnes à la fois.
- Cliquez sur un **titre de colonne** pour trier ; un second clic inverse le tri, un troisième l'annule.
- Cliquez sur une **ligne** pour ouvrir sa fiche au-dessus de la liste.
- Les longues listes sont découpées en pages ; les flèches sont en bas à droite.

La recherche instantanée

Cliquez dans le champ de recherche de l'en-tête, ou appuyez sur **Ctrl + K**. Les résultats s'affichent pendant la frappe, dès la deuxième lettre, classés par famille.

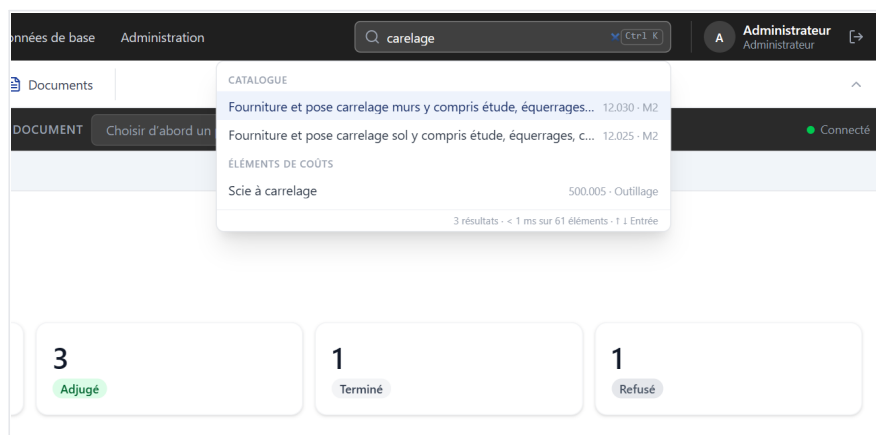

« carelage », tapé avec une faute, retrouve quand même les articles de carrelage.

- Les **accents** et les **majuscules** sont ignorés : « electricite » trouve « Électricité ».
- Les **fautes de frappe** sont tolérées : « echafodage » trouve « échafaudage ».
- Vous pouvez taper **plusieurs mots**, dans n'importe quel ordre : « dupont delemont ».
- Les flèches **haut** et **bas** parcourent les résultats, **Entrée** ouvre la fiche, **Échap** referme.
- La recherche est réservée aux administrateurs et aux responsables, car elle donne accès aux prix.

5. Les adresses

Menu **Services centraux**, bouton **Adresses**. C'est votre carnet d'adresses unique : clients, fournisseurs, sous-traitants et contacts. Une adresse saisie ici se réutilise dans les projets et les devis.

LACHAT Accueil Offres d'emploi Exécution Données de base Administration Recherche une adresse, un article, un p... Administrateur

ADRESSES Adresses EVALUATIONS Statistiques Suivi de facturation Synthèse employés

PROJET Aucun projet sélectionné DOCUMENT Choisir d'abord un projet

Adresses - Seulement actifs x

+ Nouvelle adresse Import Export Seulement actifs Tous les types

Aperçu

FICHE

Monsieur Architecte Paul
Avenue de la Gare 2
2800 Delémont
032 000 00 20
paul@archi-exemple.ch

Adresse

Type Contact Téléphone 032 000 00 20 Actif ☒

Titre Monsieur Mobile

Nom / raison sociale Architecte eMail paul@archi-exemple.ch

Prénom Paul Désignation

Rue Avenue de la Gare N° 2 NPA / Lieu 2800 Delémont

Type	Titre	Nom	Prénom	Rue	N°	NPA	Lieu	Téléphone	eMail
Contact	Monsieur	Architecte		Avenue de la Gare	2	2800	Delémont	032 000 00 20	paul@archi-exemple.ch
Client	Madame	Bernard	Léa	Rue Berlincourt	21	2854	Bassecourt		
Client	Madame	Dupont	Marie	Rue de la Gare	12	2800	Delémont	032 000 00 01	marie.dupont@example.com
Sous-traitant	Entreprise	Électricité Exemple SA		Rue Principale	30	2802	Develier	032 000 00 12	
Client	Monsieur	Favre	Jean	Rue de la Gravière	8	2855	Glovelier		
Fournisseur	Entreprise	Matériaux Exemple SA		Zone industrielle	5	2800	Delémont	032 000 00 10	vente@mat-exemple.ch
Client	Monsieur	Müller	Hans	Rue des Vergers	3	2854	Bassecourt	032 000 00 02	hans.mueller@example.com
Client	Monsieur	Rossi	Luca	Chemin des Prés	4	2822	Courroux	032 000 00 03	

Adresses Personnes de contact

9 entrées v0.3 - ph...

Le carnet : la fiche en haut, la liste en bas, un résumé à gauche.

Créer une adresse

1. Cliquez sur le bouton rouge **Nouvelle adresse**.
2. Choisissez le **type** : client, fournisseur, sous-traitant ou contact.
3. Saisissez le **nom** (ou la raison sociale), seul champ obligatoire, puis les coordonnées.
4. Quittez le formulaire ou appuyez sur **Ctrl + S** : l'adresse est créée et apparaît dans la liste.

Adresses - Seulement actifs

+ Nouvelle adresse
📄
↶
🗑️
📅
🔍
🖨️
📁 Import
📤 Export
☑️ Seulement actifs
Tous les types

Aperçu

FICHE

Nouvelle adresse en cours de saisie.

NOUVELLE ADRESSE

Type

Client

Téléphone

Actif

☑️

Titre

Mobile

N° débiteur

Nom / raison sociale

Berger

eMail

Remarque

Prénom

Claire

Désignation

Rue

Rue du Moulin

N°

NPA / Lieu

2800

Delémont

Saisie d'une nouvelle adresse.

Retrouver, modifier, supprimer

- Le menu déroulant **Tous les types** limite la liste à une famille.
- **Seulement actifs** masque les adresses que vous n'utilisez plus. Décochez **Actif** sur une fiche plutôt que de la supprimer : l'historique des projets reste intact.
- La corbeille supprime l'adresse après confirmation.

6. Le catalogue d'articles et les modèles d'étapes

Menu **Données de base**, bouton **Catalogue d'articles**. Le catalogue range vos articles par **chapitre**, c'est-à-dire par corps de métier : démontage, carrelage, sous-traitants...

Important Chaque chapitre sert de **modèle d'étape**. Quand vous l'ajoutez à un devis, l'étape est créée avec tous ses articles et leurs prix. Un catalogue bien tenu, c'est un devis vite fait.

Chap.	Code	Sous-code	Description	Un.	Achat	Vente	Type de travail
12			CARRELAGE				
12	005		Habillage prêt à carrelé	Pce	260.00	400.00	12
12	025		Fourniture et pose carrelage sol y compris étude, équerrages, coupes, encollage et jointoyages	M2	70.00	120.00	12
12	030		Fourniture et pose carrelage murs y compris étude, équerrages, coupes, encollage et jointoyages	M2	75.00	130.00	12
12	040		Fourniture et pose baguette d'angle inox ou autre y compris angles	M1	22.00	45.00	12
12	100		Fourniture et pose acryls et/ou silicones	M1	5.00	12.00	12

Les chapitres à gauche, les articles du chapitre choisi à droite.

Gérer les chapitres

- Cliquez sur un chapitre pour n'afficher que ses articles. **Tous les chapitres** affiche tout.
- Sous l'arborescence, **Nouveau chapitre** : saisissez un code et un libellé, puis **Ajouter**. Cochez « Sous-chapitre de... » pour le ranger sous le chapitre sélectionné.
- **Modifier** renomme le chapitre sélectionné. Un chapitre ne peut être supprimé que s'il est vide.

Gérer les articles

1. Sélectionnez le chapitre, puis cliquez sur **Nouvel article**.
2. Saisissez le **code**, la **description** (obligatoire), l'**unité**, le **prix d'achat** et le **prix de vente**.
3. Cochez **Titre de chapitre** pour une ligne de titre sans prix.

Astuce Les prix se saisissent comme vous en avez l'habitude : 1'250.50, 1250,5 ou 1250.50 sont tous compris.

À savoir Le prix d'achat sert au calcul de la marge dans les devis. Sans prix d'achat, la position est ignorée dans ce calcul.

7. Les éléments de coûts

Menu **Données de base**, bouton **Éléments de coûts**. Ce sont vos listes de prix : ce que vous coûtent la main-d'œuvre, les matériaux, les machines, l'outillage et les tiers.

The screenshot shows the 'Éléments de coûts' (Cost Elements) interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Offre facturation', 'Exécution', 'Services centraux', 'Données de base', and 'Administration'. The 'Données de base' menu is active, showing 'Éléments de coûts' as the selected option. The interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar has a 'GROUPE' (Group) filter with 'Tous les groupes' (All groups) selected. The main content area shows a table of cost elements. The table has columns for 'Grp.', 'N° élément', 'Description', 'Un.', 'Un. régie', 'Prix fourn.', 'Net', 'Prix régie', and 'Tarif régie'. The table is filtered by '2 - Matériaux' (Materials) and shows items like 'Chiffon microfibre bleu (10 pcs) paquet' and 'Ciment CEM II 25 kg'.

Les six familles en onglets, les groupes à gauche.

Famille	Contenu
1 - Salaire	Tarifs horaires par fonction : ouvrier qualifié, chef d'équipe, apprenti...
2 - Matériaux	Produits et matériaux, avec prix fournisseur et prix de revente.
3 - Machines/Engins	Mini-pelle, dumper, nacelle...
4 - Matériaux exploitation	Consommables : carburant...
5 - Outillage	Outils facturés à la journée.
6 - Tiers	Sous-traitants.

Les trois niveaux de prix

- **Prix fournisseur** : ce que l'élément vous coûte, tarif brut.
- **Prix net** : après vos remises. S'il est laissé vide, il reprend le prix fournisseur.
- **Prix régie** : le prix majoré, facturé au client. La colonne **Majoration** calcule l'écart en pour cent.

Pour créer un élément, cliquez sur **Nouvel élément** : la famille de l'onglet ouvert et le groupe sélectionné sont déjà proposés.

8. Les projets

Menu **Offre facturation**, bouton **Projets**. Un projet représente un chantier. Tout le reste s'y rattache : devis, rapports, régie, factures.

La capture d'écran montre l'interface de gestion des projets. À gauche, une barre de navigation avec 'Accueil', 'Offre facturation', 'Exécution', 'Services centraux', 'Données de base' et 'Administration'. Le menu 'Projets' est sélectionné. En haut à droite, une barre de recherche et un profil utilisateur 'Administrateur'. Le contenu principal est divisé en une barre d'outils avec '+ Nouveau projet' et des filtres, et une section 'Projets' avec un formulaire et un tableau. Le formulaire permet de saisir des informations sur un projet spécifique (N° de projet, Client, Désignation, Adresse, etc.). Le tableau en bas liste plusieurs projets avec des statuts colorés (vert pour 'Adjugé', gris pour 'Terminé').

La fiche du projet en haut, la liste colorée par statut en bas.

Créer un projet

1. Cliquez sur **Nouveau projet**.
2. Choisissez le **client**. Son nom est repris dans la **désignation** et son adresse devient l'adresse du chantier. Corrigez-la si le chantier est ailleurs.
3. Le **numéro de projet** est proposé automatiquement : NPA du chantier, puis numéro d'ordre. Après 2854-002 vient 2854-003. Vous pouvez le modifier ; le bouton **Proposer** le recalcule.
4. Complétez la désignation avec les travaux à réaliser, par exemple « Muller Hans - Rénovation cuisine ».
5. Quittez le formulaire ou appuyez sur **Ctrl + S**. Le projet devient le **projet courant**, affiché dans la barre du haut.

Export

Tous 6

En cours 1

Adjugé 3

Terminé 1

Refusé 1

☒ Seulement actifs

☐ Modèles

Général

Adresses

Photos

N° de projet

2854-003

Proposer

☒ Actif

☐ Modèle de projet

Client

Muller Hans, Bassecourt

Désignation 1

Muller Hans - Rénovation cuisine

Désignation 2

Rue du chantier

Rue des Vergers

N° 3

Téléphone

NPA / Lieu

2854

Bassecourt

Mobile

N° contrat

Unité d'imput.

Le client choisi a rempli la désignation, l'adresse et proposé le numéro 2854-003.

Les statuts

Statut	Signification	Couleur dans la liste
En cours	Offre en préparation ou en attente de réponse.	Blanc
Adjugé	Le client a confirmé, le chantier est à faire ou en route.	Vert
Terminé	Chantier achevé.	Gris clair
Refusé	L'offre n'a pas été retenue.	Gris foncé

Les pastilles de la barre d'outils filtrent la liste par statut et affichent le nombre de projets de chacun.

Modèles affiche les projets cochés « Modèle de projet », rangés à part.

Les adresses du projet

Onglet **Adresses**. En plus de l'adresse du chantier, un projet peut avoir autant d'adresses que nécessaire, chacune avec son **rôle** : facturation, architecte, direction des travaux, accès...

Projets

Nouveau projet

Export

Tous 6

En cours 1

Adjugé 3

Terminé 1

Refusé 1

☒ Seulement actifs

☐ Modèles

Projet

2800-001
Exemple Dupont - Rénovation salle de bain
En cours

CLIENT
Dupont Marie
Delémont

Général

Adresses (1)

Photos

Architecte

Architecte Paul
Delémont - 032 000 00 20

+ Ajouter une adresse

L'onglet Adresses d'un projet.

1. Cliquez sur **Ajouter une adresse** et indiquez son rôle.
2. Choisissez une adresse **depuis le carnet** : ses coordonnées sont recopiées. Vous pouvez les adapter pour ce projet sans modifier le carnet. Ou saisissez-la librement.
3. Cliquez sur **Ajouter**.

Les photos

Onglet **Photos**. Cliquez sur **Ajouter des photos** ou glissez les fichiers dans la zone. Formats JPG, PNG ou WebP, 10 Mo par photo au maximum, jusqu'à 12 photos par envoi.



La zone d'envoi des photos.

- Saisissez une **légende** sous la photo ; elle s'enregistre quand vous quittez le champ.
- **Mettre en couverture** place la photo en tête : elle s'affiche dans le panneau de gauche.
- Un clic sur une photo l'ouvre en grand dans un nouvel onglet.

À savoir Les photos sont privées. Elles ne sont visibles que par les utilisateurs connectés.

9. Les devis

Le devis se crée juste après le projet. Il fixe les **étapes du chantier** : les rapports journaliers, la régie et la facture s'y rattacheront. C'est la principale différence avec BauBit.

Créer le devis

1. Depuis la fiche du projet, dans le panneau de gauche, cliquez sur **Créer le devis** : le modèle de devis par défaut est appliqué. Ou, dans la page Documents, sur **Nouveau devis** : vous choisissez le modèle, ou un devis vide.
2. Le devis reçoit son numéro : **numéro de projet - DE . numéro d'ordre**, par exemple 2800-001-DE.1.
3. Le destinataire est repris du client du projet.

Les modèles de devis

Menu **Données de base**, bouton **Modèles de devis**. Un modèle rassemble les étapes générales d'un type de chantier, dans l'ordre : par exemple architecture, installation de chantier, démontage, carrelage, sous-traitants, divers. Cochez **Modèle par défaut** pour qu'il s'applique à chaque nouveau devis.

- Ajoutez une étape depuis un **chapitre du catalogue**, avec ou sans ses articles, ou une **étape libre**.
- Réordonnez les étapes avec la poignée. Enregistrez avec le bouton ou **Ctrl + S**.
- Dans un devis, **Appliquer un modèle de devis** (panneau de gauche) ajoute les étapes manquantes.
- Le bouton **Enregistrer comme modèle**, dans la barre d'outils du devis, crée un modèle à partir des étapes du devis ouvert.

The screenshot displays the Lachat software interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Offre facturation', 'Exécution', 'Services centraux', 'Données de base', and 'Administration'. A search bar is present on the right. Below the navigation bar, there's a section for 'PROJETS' and 'DOCUMENTS'. The main content area shows a project '2800-001 - Exemple Dupont - Rénovation salle de bain' with a status 'En cours'. The left sidebar has a 'Devis' section with 'Nouveau devis' and 'Nouvelle version' buttons. Below this, 'DOCUMENTS DU PROJET' lists '2800-001-DE.1'. The 'ÉTAPES DU DEVIS' section shows a list of steps with their respective amounts. The 'APPLIQUER UN MODÈLE DE DEVIS' section has a dropdown to choose a model and an 'Appliquer' button. The main area displays a 'Devis estimatif' table for '2800-001-DE.1' dated '21.09.2026'. The table has columns: Pos., Description, Un., Quantité, Prix, and Montant. It lists 18 items, including 'Suivi et installation de chantier', 'Location tableau électrique', 'Fourniture et pose barrières chantier', etc. A footer bar shows '16 entrées', 'Net: 8725.00 CHF', 'TTC: 9431.75 CHF', and 'v0.3 - phase 6'.

Un devis : ses étapes à gauche, le détail chiffré à droite.

Ajouter les étapes

Dans le panneau de gauche, rubrique **Ajouter depuis un modèle** :

1. Choisissez un **modèle d'étape**, c'est-à-dire un chapitre de votre catalogue.

2. Laissez coché **Avec ses articles et leurs prix** pour récupérer toutes les positions du chapitre. Il ne vous restera que les quantités à saisir.
3. Cliquez sur **Ajouter l'étape**. Une coche signale les modèles déjà utilisés.

Le panneau des étapes : le modèle « Terrassement » est sélectionné.

- **Étape libre** : saisissez un code et un libellé, puis cliquez sur le +.
- Survolez une étape pour la **monter**, la **descendre**, la **renommer** ou la **supprimer** (ses positions sont supprimées avec elle).
- Un clic sur une étape fait défiler le détail jusqu'à elle. Son total est affiché à droite.

Saisir les positions rapidement

Sous chaque étape se trouve un champ **Ajouter une position**. Tout se fait au clavier :

1. Tapez quelques lettres de l'article, ou son code. Les articles du catalogue apparaissent aussitôt, fautes de frappe comprises.
2. **Entrée** insère l'article avec son unité et son prix. Le curseur se place sur la **quantité**.
3. Saisissez la quantité, **Entrée** : le curseur passe sur le **prix**, déjà rempli. Corrigez-le si besoin.
4. **Entrée** à nouveau : vous revenez au champ d'ajout, prêt pour la position suivante.

Pos.	Description	Un.	Quantité	Prix	Montant
3.1	Habillage prêt à carreler	Pce	1.00	400.00	400.00
3.2	Fourniture et pose carrelage sol y compris étude, équerrages, coupes, encollage et jointoyages	M2	12.00	120.00	1'440.00
3.3	Fourniture et pose carrelage murs y compris étude, équerrages, coupes, encollage et jointoyages	M2	30.00	130.00	3'900.00
3.4	Fourniture et pose baguette d'angle inox ou autre y compris angles	M1	8.00	45.00	360.00
3.5	Fourniture et pose acryls et/ou silicones	M1	20.00	12.00	240.00

+ bagete angle
Fourniture et pose baguette d'angle inox ou autre y compris angles 12.040 · M1 · 45.00 CHF – 1 vide
Ajouter en ligne libre : « bagete angle »
Créer l'article « bagete angle » dans le catalogue et l'ajouter
Ajouter comme sous-titre : bagete angle

« bagete angle » retrouve la baguette d'angle. Les deux dernières lignes servent quand l'article n'existe pas.

Quand l'article n'existe pas

- **Ajouter en ligne libre** : la position est créée avec votre texte, à chiffrer à la main.
- **Créer l'article dans le catalogue et l'ajouter** : l'article est créé dans le chapitre de l'étape, puis ajouté au devis, sans quitter la page. Pensez à compléter plus tard son unité et son prix dans le catalogue.

Modifier une position

- Cliquez dans une cellule et modifiez : code, description, unité, quantité, prix. Le **montant** se recalcule aussitôt, les totaux un instant après.
- La case **Opt.** marque une **option** : elle reste affichée mais ne compte pas dans le total.
- Pour déplacer une ligne, saisissez la **poignée** (les six points à gauche) et glissez-la à sa nouvelle place, dans la même étape ou dans une autre. Un trait bleu indique où elle sera déposée. Au clavier : cliquez la poignée, puis flèches haut et bas.
- Au survol de la ligne, la corbeille la supprime.

À savoir Les positions s'enregistrent toutes seules quand vous quittez la ligne. La barre d'état, en bas, affiche en permanence le net et le TTC du devis.

Sous-titres, textes et lignes sans quantité

- Le champ d'ajout propose aussi **Ajouter comme sous-titre** et **comme texte**. Un sous-titre ouvre un sous-groupe numéroté (6.1, puis 6.1.1, 6.1.2...) ; un texte s'imprime en italique, sans prix ni numéro.
- Le détail se présente **comme la feuille imprimée** : numéros, colonnes et retours à la ligne sont ceux du PDF. Le code du catalogue n'est plus affiché dans la ligne ; il apparaît au survol du numéro.
- Une étape créée depuis un modèle contient tous ses articles. Le bouton – **n sans quantité**, sur l'étape ou dans la barre d'outils, retire d'un coup les lignes que vous n'avez pas chiffrées. Une ligne sans quantité mais avec un prix (« Ouvrier qualifié H. 90.- ») est conservée et s'imprime.

Le sous-détail de prix

Il remplace les formules notées en remarque dans BauBit. Sur une ligne, cliquez sur l'icône **calculatrice**, à droite : une fenêtre détaille le prix par famille de coûts, main-d'œuvre, matériaux, machines, matériel d'exploitation, outillage et sous-traitants.

Sous-détail de prix

02.003 · Suivi et installation de chantier y compris transports personnels, outillages et matériaux. Mise en œuvre, manutention et admin...

DIM ☒ Prix de la position par ml (total + DIM)

Ressource	Quantité	Un.	× DIM	Cond.	Comptée	Coût unit.	Coût	Maj. %	Vente
MO Main-d'œuvre									41.60
Pose baguettes (8.-/ml + 30 %)	1	ml	☒	—	4	8	32.00	30	41.60
+ Ajouter main-d'œuvre : élément de coûts ou libellé, puis Entrée									
MAT Matériaux									190.00
Baguette structurée crème (2.5 ml/pce)	1	ml	☒	2.5	2 × 2.5	65	130.00	0	130.00
Angles	1	pce	☒	—	4	15	60.00	0	60.00
+ Ajouter matériaux : élément de coûts ou libellé, puis Entrée									
MACH Machines									
+ Ajouter machines : élément de coûts ou libellé, puis Entrée									
MAT EX Matériaux d'exploitation									
+ Ajouter matériaux d'exploitation : élément de coûts ou libellé, puis Entrée									
OUT Outillage									
+ Ajouter outillage : élément de coûts ou libellé, puis Entrée									
ST Sous-traitants									
Remarque interne (jamais imprimée)									
Modèle : Baguettes carrelage — Vendu 45.-/ml.									
Coût total									222.00
Vente calculée (coûts majorés)									231.60
Par ml : coût / vente									55.50 / 57.90
Prix calculé de la position									57.90
Prix saisi dans le devis									95.00 (+37.10)
Enregistré automatiquement Enregistrer comme sous-détail type									
Fermer									Reporter 57.90 dans le prix

Le sous-détail d'une position : un sous-détail type a été chargé, les lignes restent modifiables.

- Chaque ligne : quantité, coût unitaire, majoration en pour cent ; le logiciel calcule le coût et le prix de vente. La quantité peut être **par unité de dimension** (m², ml...) et arrondie au **conditionnement**.
- **Charger un sous-détail type** reprend un ouvrage de votre bibliothèque (menu **Données de base**, bouton **Sous-détails types** : les 110 ouvrages du métreur y sont déjà). **Enregistrer comme sous-détail type** ajoute le vôtre à la bibliothèque.
- **Reporter le prix calculé** inscrit le prix de vente dans la position. Sinon le prix saisi à la main reste, et l'écart est signalé. Le coût alimente la marge de la récapitulation.
- Conventions du métreur : main-d'œuvre vendue 750.- la personne-jour, 90.- l'heure ; fournitures +30 %.

L'en-tête du devis

Onglet **En-tête** : objet, date, initiales, **statut** (en cours, envoyé, accepté, refusé), taux de **TVA**, **rabais** en pour cent, destinataire, texte d'introduction et conditions.

En-tête

Informations du document

Type: Devis

N° de document: 2800-001-DE.1

Objet: Rénovation salle de bain

Date: 21.09.2026

Statut: En cours

TVA %: 8.1

Rabais %:

Total net CHF: 8'725.00

Total TTC CHF: 9'431.75

Destinataire

Depuis le carnet: — saisie libre —

Titre: Madame

Nom: Dupont

Prénom: Marie

Rue / N°: Rue de la Gare 12

NPA / Lieu: 2800 Delémont

eMail: marie.dupont@exemple.ch

Textes du document

Texte d'introduction: Madame, Monsieur, suite à notre visite...

Conditions et remarques finales:

L'en-tête du devis.

Astuce Le destinataire est une copie de l'adresse au moment du devis. Vous pouvez l'adapter sans modifier le carnet, et un changement ultérieur dans le carnet ne modifie pas un devis déjà envoyé.

La récapitulation

Onglet **Récapitulation** : total par étape, rabais, TVA, arrondi à 5 centimes et total TTC. L'encadré **Marge**, à usage interne, compare vos prix de vente à vos prix d'achat. Il passe en rouge sous 30 %. Les options sont listées à part.

File version	2800-001-DE.1	En cours	2800-001 - Exemple Dupont - Rénovation salle de bain
Détail	En-tête	Récapitulation	Aperçu
Étape	Montant CHF	MARGE (USAGE INTERNE)	
02 SUIVI ET INSTALLATION DE CHANTIER	285.00	42.6 %	
03 DEMONTAGE	1'200.00		
12 CARRELAGE	6'340.00	Vente concernée	7'525.00
18 DIVERS ET IMPREVUS	900.00	Prix de revient	4'320.30
Total des étapes	8'725.00	Calculée sur les 7 positions qui ont un prix de revient (sous-détail de prix ou prix d'achat de l'article), sur 8 positions chiffrées.	
TVA 8.1 %	706.73		
Arrondi à 5 centimes	0.02		
Total TTC	9'431.75		

La récapitulation et la marge interne.

L'aperçu et le PDF

Onglet **Aperçu**, ou l'imprimante de la barre d'outils. Le devis est mis en page comme vos devis actuels : page de garde avec le logo, le destinataire, « Bassecourt, le ... », la récapitulation par étape, la TVA, les conditions de paiement et la signature du donneur d'ordre ; puis le détail des positions, numéroté en continu.

L'aperçu du devis, tel qu'il sera imprimé.

- Le bouton **Télécharger** enregistre le PDF pour l'envoyer par email.
- Les remarques internes et les sous-détails de prix ne sont jamais imprimés.
- Un devis **accepté** passe automatiquement le projet au statut **Adjugé**, et devient le devis de référence des rapports journaliers.

Nouvelle version, explorateur

- **Nouvelle version** copie le devis avec toutes ses étapes et positions : DE.1 devient DE.2. Utile quand le client demande une variante ; l'original reste intact.
- L'onglet **Explorateur** liste tous les documents, tous projets confondus. Un clic ouvre le devis et sélectionne son projet.
- La corbeille supprime le document après confirmation.

10. Les rapports journaliers

Menu **Exécution**, bouton **Rapports journaliers**. Un rapport par jour et par chantier : qui a travaillé, combien d'heures, sur quelle étape du devis, avec quel matériel. C'est la source de la régie, du contrôle des heures et, bientôt, de la facture finale.

Important Les heures se saisissent **sur les étapes du devis** du projet, et non sur une liste générale de types de travail comme dans BauBit. Créez le devis et ses étapes avant le premier rapport.

The screenshot shows the 'Rapports journaliers' interface for project '2822-001 - Exemple Rossi - Aménagements extérieurs'. The main form includes fields for 'Numéro' (007), 'Date' (13.08.2026), 'Devis' (2822-001-DE1 - accepté), 'Remarque' (Aménagements extérieurs : terrassement, maçonnerie et finitions), 'Météo' (Ensoleillé), 'Responsable' (Martin Pierre), and 'Statut' (1-EC - En cours). Below the form is a table titled 'Étapes issues du devis 2822-001-DE1 - 3 étapes' with columns for 'Collaborateur', 'Base', and various work stages (04 TERRASSEMENT, 07 MAÇONNERIE, 18 DIVERS ET IMPR., 1001 Travail du samedi, 1110 Repas, 1120 Kilomètres, 1150 Formation). The table shows hours and amounts for Martin Pierre and Rossi Luca. At the bottom, there is a summary bar with '10 entrées', 'Montant total : 10318.23 CHF', 'Heures : 172.50', 'Rapport brut : 925.02 CHF', 'régie : 1692.00', 'client : 1692.00', 'Heures du rapport : 18.00', and 'v0.3 - phase 8'.

Les rapports du projet à gauche, colorés par statut ; l'en-tête et la grille des heures à droite.

Créer le rapport du jour

1. Choisissez le **projet** dans la barre du haut.
2. Cliquez sur **Nouveau rapport**. Il reçoit le numéro suivant (001, 002...), la date du jour et le devis accepté du projet (sinon le dernier devis). Vous êtes proposé comme responsable.
3. Complétez l'en-tête : **date** (les chevrons changent de jour), **remarque** (travaux effectués), **météo** et températures, **responsable**. Tout s'enregistre automatiquement.
4. Cochez **Régie** si le rapport est facturable en régie ; c'est le cas par défaut.

La grille des heures

Onglet **Salaire**. Une ligne par collaborateur présent, une colonne par étape du devis, puis les colonnes des types de travail : travail du samedi, repas, kilomètres, formation.

Statut **1-EC · En cours**

Salaire Matériaux Machines Mat. exploitation Outillage Tiers Événements Fichiers Photos

Étapes issues du devis **2822-001-DE.1** · 3 étapes

Collaborateur	Base	04 TERRASSEMENT...	07 MAÇONNERIE	18 DIVERS ET IMPR...	1011 Travail du sam...	1110 Repas	1120 Kilomètres	1150 Formation	Total heures	Montant
Martin Pierre	52.78		9						9.00	475.02
Rossi Luca	50.00		9						9.00	450.00
Total			18.00						18.00	925.02

Équipe du rapport Entrée · ligne suivante · flèches · déplacement · enregistré à la sortie de la

La grille des heures : 9 h de maçonnerie pour deux collaborateurs.

1. En bas de la grille, choisissez un collaborateur et cliquez sur **Ajouter**, ou reprenez d'un clic **l'équipe du rapport précédent**.
 2. Cliquez dans la cellule de l'étape et tapez les heures. **Entrée** descend à la ligne suivante, les **flèches** déplacent le curseur : un rapport se saisit sans souris.
 3. Chaque cellule s'enregistre quand vous la quittez. Une valeur à 0 l'efface ; le collaborateur reste dans le rapport.
- Le **total des heures** d'un collaborateur ne compte que les étapes du devis et les types de travail en heures ; un repas ou des kilomètres ne sont pas des heures.
 - Pour la gestion, la colonne **Base** rappelle le tarif horaire du collaborateur et **Montant** le coût de sa journée. L'ouvrier ne voit aucun de ces chiffres.
 - La corbeille, au survol de la ligne, retire le collaborateur et ses heures.

Matériaux, machines, outillage, tiers

Les onglets **Matériaux**, **Machines**, **Mat. exploitation**, **Outillage** et **Tiers** reprennent les familles des éléments de coûts. Chaque ligne est rattachée à une étape du devis.

→ →

Número **004** 2822-001 - Exemple Rossi - Aménagements extérieurs Date **10.08.2026** Lu < >

Devis **2822-001-DE.1 · accepté**

Remarque **Aménagements extérieurs : terrassement, maçonnerie et finitions.** Météo **Ensoleillé** min max ☀

Responsable **Martin Pierre** ☒ Régie

Statut **2-CTRL · En contrôle**

Salaire **Matériaux** Machines Mat. exploitation Outillage Tiers Événements Fichiers Photos

Étape du devis	Désignation	Quantité	Un.	Coût unit.	Montant	Remarque
07 MAÇONNERIE	Chiffon microfibre bleu (10 pcs) paquet	10	Paquet	18.8	188.00	
07 MAÇONNERIE	Chiffon de nettoyage couleur	20	Sac	13.85	277.00	

+ Ajouter matériaux : élément de coûts ou désignation libre, puis Entrée

Total matériaux **465.00**

Les matériaux d'un rapport : libellé, quantité, unité, coût ; prix repris des éléments de coûts.

- Tapez quelques lettres dans le champ d'ajout : les éléments de coûts de la famille apparaissent. **Entrée** reprend le libellé, l'unité et le prix net, et place le curseur sur la quantité.
- Sans résultat, Entrée crée une **ligne libre** avec votre texte, à compléter.
- Les lignes se modifient en place et s'enregistrent quand vous les quittez.

Événements, fichiers et photos

- **Événements** : incidents, visites, livraisons, décisions prises sur le chantier.
- **Fichiers** et **Photos** : glissez les documents (plans, bons de livraison) et les photos du jour. Une légende peut être saisie sous chaque photo.

Le cycle de validation

Statut	Signification	Couleur
1-EC En cours	Le rapport se remplit. L'ouvrier peut encore le modifier.	Rouge
2-CTRL En contrôle	Transmis à la gestion, qui le vérifie et fixe les prix de régie. Seule la gestion le modifie.	Vert
3-FAC Facturé en régie	Repris dans une facture : verrouillé.	Bleu

- Le bouton **coche verte** de la barre d'outils passe le rapport **en contrôle**. La gestion peut revenir en arrière avec le champ Statut de l'en-tête.
- Les filtres du panneau de gauche limitent la liste à un **mois** ou à un **statut**. Les flèches de la barre d'outils passent d'un rapport à l'autre.

Ce que voit l'ouvrier

Un ouvrier connecté ne voit que **ses** rapports : ceux qu'il a créés, dont il est responsable ou dans lesquels il a des heures. Il saisit les heures de toute l'équipe, le matériel et les photos, puis transmet le rapport au contrôle. Il ne voit jamais un tarif ni un montant.

Accueil

Offre facturation

Exécution

Ouvrier démo

CONTROLLING

Rapports journaliers

PROJET

Aucun projet sélectionné

DOCUMENT

Réservé à la gestion

Connecté

Rapports journaliers

+ Nouveau rapport

Tous les statuts

Tous les projets

Tous les rapports

Tous les projets

N°003

2800-001 - Exemple Dupont - Rénovation salle de bain

Date

28.08.2026

Ve

17

20

Météo

Pluie, couvert

Responsable

Martin Pierre

Statut

1-EC - En cours

Remarque

RAPPORT 3 :
Démontage : démontage sol carrelage

Étapes issues du devis 2800-001-DE1 - 4 étapes

Collaborateur	02 SUIVE ET INSTA...	03 DEMONTAGE	12 CARRELAGE	18 DIVISE ET AMPL...	1901 Travail du serr...	1910 Regras	1920 Kilomètres	1930 Formation	Total heures
Favre Jean		3	2.5						5.50
Keller Anna									
Nguyen Thi			5						5.00
Rossi Luca				5					5.00
Total	3.00	12.50							15.50

Le rapport vu par un ouvrier : ni colonne Base, ni Montant, ni total en francs.

Astuce Pour qu'un ouvrier retrouve ses rapports, reliez son compte de connexion à sa fiche de collaborateur (chapitre 11). Il devient alors responsable par défaut des rapports qu'il crée.

11. Les collaborateurs et les types de travail

Menu **Données de base**, bouton **Collaborateurs**. Chaque employé y a sa fiche : numéro, nom, tarif horaire et tarif régie. Seuls les collaborateurs **actifs** sont proposés dans les rapports.

Collaborateurs

N°	Nom	Prénom	Coût h.	Régie h.
106	Bernard	Léa	48.50	82.00
105	Favre	Jean	55.00	98.00
103	Keller	Anna	52.78	90.00
101	Martin	Pierre	52.78	98.00
104	Nguyen	Thi	50.00	82.00
102	Rossi	Luca	50.00	90.00

MARTIN PIERRE

Numéro: 101

Nom: Martin

Prénom: Pierre

Tarif horaire (coût): 52.78 CHF / h, coût brut pour l'entreprise

Position régie: 010.010 - Chef d'équipe - 98.00

Tarif régie propre: 98.00 tarif régie appliqué : 98.00 CHF / h

Compte de connexion: — aucun —

☒ Actif (proposé dans les rapports)

Journée de 9 h : 475.02 CHF de coût, 882.00 CHF en régie.

TYPES DE TRAVAIL (COLONNES DE LA GRILLE DES HEURES)

Code	Libellé	Unité	Actif
1011	Travail du samedi	h (heures)	☒
1110	Repas	nb (nombre)	☒
1120	Kilomètres	km	☒
1150	Formation	h (heures)	☒

Seules les unités en heures entrent dans le total des heures, le coût et la régie.
Un type déjà utilisé est désactivé plutôt que supprimé.

La fiche d'un collaborateur et, à droite, les types de travail de la grille des heures.

Les deux tarifs

- **Tarif horaire (coût)** : ce que l'heure coûte à l'entreprise. Il est copié dans chaque rapport au moment de la saisie : un changement de tarif ne modifie pas les rapports passés.
- **Position régie** : la fonction facturée au client, choisie parmi les éléments de coûts de la famille Salaire, par exemple « 010.010 Chef d'équipe 98.- ». Son prix régie devient le tarif régie du collaborateur.
- **Tarif régie propre** : à remplir seulement si ce collaborateur se facture à un autre prix que sa position.

Le compte de connexion

Un administrateur relie la fiche au compte de l'ouvrier (chapitre 14). Un compte ne peut être relié qu'à un seul collaborateur.

Les types de travail

À droite de la fiche : les colonnes supplémentaires de la grille des heures. Modifiez un libellé ou une unité en place, décochez **Actif** pour retirer une colonne, ou ajoutez-en une en bas de la liste. Seules les unités en **heures** comptent dans les totaux, le coût et la régie ; un type déjà utilisé dans des rapports est désactivé plutôt que supprimé.

12. La régie : brut, régie, client

Menu **Exécution**, bouton **Rapports régie**. La régie reprend chaque ligne des rapports journaliers du projet courant, heures et matériel, et lui donne **trois prix**, comme le rapport régie de BauBit.

Niveau	D'où il vient	À quoi il sert
Brut	Le coût pour l'entreprise : tarif horaire du collaborateur, prix net de l'élément de coûts.	Le coût réel du chantier, la marge.
Régie	Le tarif majoré : position régie du collaborateur, prix régie de l'élément de coûts, ou coût brut majoré de 30 % (réglable) quand l'élément n'a pas de prix régie.	Le prix de référence de votre tarif.
Client	Égal au prix régie, tant que vous ne le changez pas.	Le prix qui sera facturé.

LACHAT

Accueil

Offre facturation

Exécution

Services centraux

Données de base

Administration

Rechercher une adresse, un article, un p

Administrateur

PLANNINGRESSOURCES

Planning projet

Planning collaborateurs

Planning engins

CONTROLLING

Rapports journaliers

Explorateur rapports journaliers

Rapport collaborateur

Evaluations

Contrôle des heures

PROJET

2822-001 - Exemple Rossi - Aménagements extérieurs

Adjugé

DOCUMENT

Aucun document ouvert

Connecté

Régie : 2822-001 - Exemple Rossi - Aménagements extérieurs

Rapports

Tous les statuts

Tous les collaborateurs

Du

jj.mm.aaaa

au

jj.mm.aaaa

Inclure les rapports hors régie

2822-001 - Exemple Rossi - Aménagements extérieurs

Date	N°	Statut	Heures	Client
03.08.2026 Lu	001	3-FAC	18.00	1'548.00
04.08.2026 Ma	002	3-FAC	18.00	1'548.00
05.08.2026 Me	003	2-CTRL	22.00	1'985.00
10.08.2026 Lu	004	2-CTRL	18.00	3'621.50
11.08.2026 Ma	005	2-CTRL	18.00	1'692.00
12.08.2026 Me	006	2-CTRL	18.00	1'692.00
13.08.2026 Je	007	1-EC	18.00	1'692.00
17.08.2026 Lu	008	1-EC	18.00	1'692.00
18.08.2026 Ma	009	1-EC	11.50	1'107.00

Tous les rapports du projet

Tous les projets

Lignes de régie

Récapitulation

Brut = coût pour l'entreprise Régie = tarif majoré (position régie du collaborateur, prix régie de l'élément ou coût majoré) Client = prix final, modifiable jusqu'à la facturation

Étape	Désignation	Désignation régie	Un.	Quantité	Brut	Montant	Régie	Mt
Rapport 001 - 03.08.2026 Lu Facturé en régie verrouillé								
04 TERRASSEMENT ET ALENTOURS	MO Rossi Luca	010.000 Ouvrier qualifié	h	9	50.00	450.00	90.00	8
04 TERRASSEMENT ET ALENTOURS	MO Nguyen Thi	010.005 Ouvrier non qualifié	h	9	50.00	450.00	82.00	7
Total du rapport					900.00			1'5
Rapport 002 - 04.08.2026 Ma Facturé en régie verrouillé								
04 TERRASSEMENT ET ALENTOURS	MO Rossi Luca	010.000 Ouvrier qualifié	h	9	50.00	450.00	90.00	8
04 TERRASSEMENT ET ALENTOURS	MO Nguyen Thi	010.005 Ouvrier non qualifié	h	9	50.00	450.00	82.00	7
Total du rapport					900.00			1'5
Rapport 003 - 05.08.2026 Me En contrôle								
04 TERRASSEMENT ET ALENTOURS	MO Rossi Luca	010.000 Ouvrier qualifié	h	9	50.00	450.00	90.00	8
04 TERRASSEMENT ET ALENTOURS	MO Nguyen Thi	010.005 Ouvrier non qualifié	h	9	50.00	450.00	82.00	7
04 TERRASSEMENT ET ALENTOURS	MO Favre Jean	010.010 Chef d'équipe	h	4	55.00	220.00	98.00	3
Total du rapport					1'120.00			1'9
Rapport 004 - 10.08.2026 Lu En contrôle								
07 MAÇONNERIE	MO Martin	010.010 Chef d'équipe	h	9	52.78	475.02	98.00	8

25 entrées Brut : 10'318.23 CHF | Régie : 17'754.50 CHF | Client : 17'799.50 CHF | Heures : 172.50 Marge sur le prix client : 42.0 % v0.3 - phase 6

Les lignes de régie du projet, rapport par rapport, avec les trois prix et leurs montants.

Contrôler et corriger les prix

1. Choisissez le **projet** dans la barre du haut. Les rapports marqués « Régie » apparaissent à gauche ; cliquez sur l'un d'eux pour ne voir que ses lignes, ou filtrez par statut, période ou collaborateur.
2. Cliquez dans une cellule **Brut**, **Régie** ou **Client**, tapez le nouveau prix, puis **Entrée** ou quittez la cellule. Les montants et les totaux se recalculent aussitôt.
3. Un prix client différent du prix régie s'affiche en **rouge**, pour le repérer d'un coup d'œil.
 - Tant que le prix client n'a pas été fixé à part, il **suit** le prix régie que vous modifiez.
 - Les rapports **facturés** sont verrouillés : leurs prix ne se modifient plus.
 - Le titre de chaque groupe ouvre le rapport journalier correspondant.

- Le bouton **flèches circulaires** de la barre d'outils réapplique les tarifs actuels à tous les rapports non facturés du projet, après une mise à jour des listes de prix par exemple. Les prix saisis à la main sont alors remplacés.

La récapitulation

Lignes de régieRécapitulation									
Brut = coût pour l'entrepriseRégie = tarif majoré (position régie du collaborateur, prix régie de l'élément ou coût majoré)Client = prix final, modifiable jusqu'à la facturation									
Par famille					Par rapport				
Famille	Heures	Brut	Régie	Client	Marge	Rapport	Statut	Heures	Brut
Main-d'œuvre (heures)	172.50	8'863.23	15'825.00	15'870.00	44.2 %	001 - 03.08.2026 Lu	3-FAC	18.00	900.00
Matériaux		465.00	604.50	604.50	23.1 %	002 - 04.08.2026 Ma	3-FAC	18.00	900.00
Machines		140.00	220.00	220.00	36.4 %	003 - 05.08.2026 Me	2-CTRL	22.00	1'120.00
Sous-traitants		850.00	1'105.00	1'105.00	23.1 %				
Total	172.50	10'318.23	17'754.50	17'799.50	42.0 %				
Marge = (client - brut) / client. Seuil interne : 30 %.									

Les totaux par famille et par rapport, avec la marge sur le prix client.


L'onglet **Récapitulation** totalise les trois niveaux par famille (main-d'œuvre, matériaux, machines, outillage, sous-traitants) et par rapport. La **marge** compare le prix client au coût brut ; elle passe en rouge sous 30 %. La barre d'état affiche en permanence le brut, la régie, le client et les heures.

À savoir

La majoration par défaut (30 %) et la durée d'une journée (9 h) se règlent dans **Administration, Configuration**. Un ouvrier n'accède ni à la régie ni à ces réglages.

13. Le contrôle des heures

Menu **Exécution**, bouton **Contrôle des heures**. Pour chaque collaborateur, un tableau mensuel croise ses **chantiers** et les **jours** : les heures viennent des rapports journaliers, rien n'est à ressaisir.

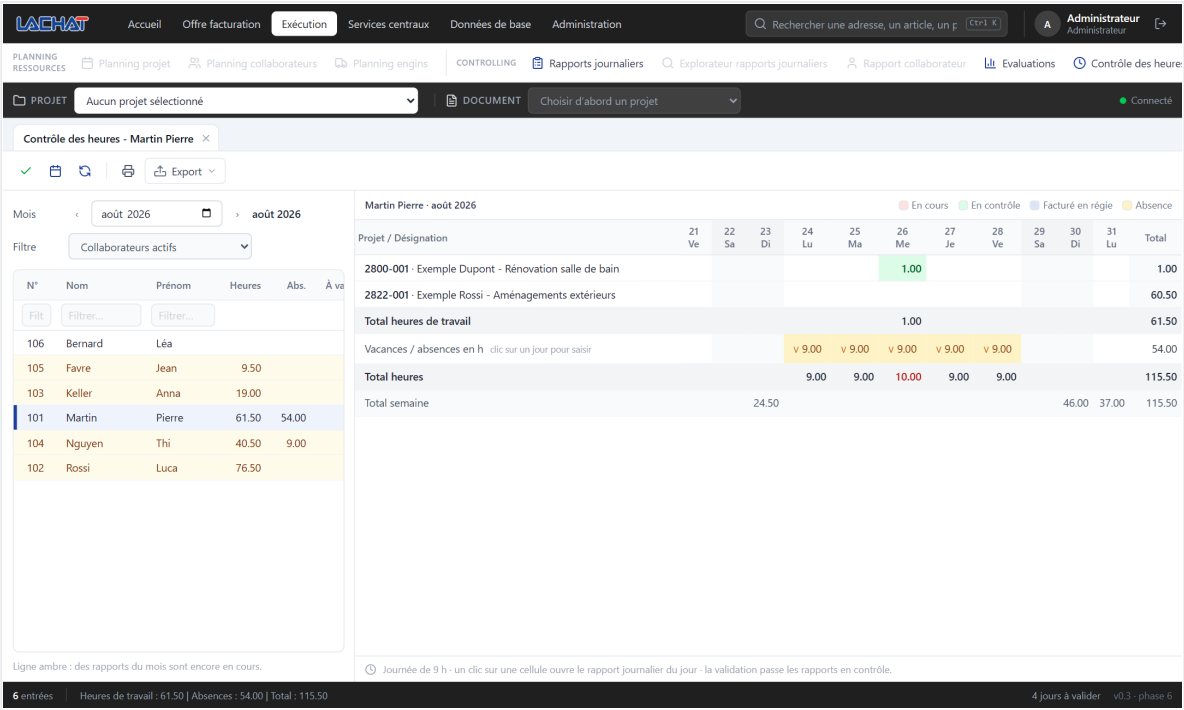

Le mois d'un collaborateur : en vert les jours contrôlés, en rouge ceux dont le rapport est encore en cours.

Lire le tableau

- À gauche, les collaborateurs du mois avec leurs **heures**, leurs **absences** et le nombre de rapports à **valider**. Une ligne **ambre** signale des rapports encore en cours. Les chevrons et le champ **Mois** changent de mois ; le filtre **Heures à valider** ne garde que les cas à traiter.
- À droite, une ligne par chantier. La couleur d'une cellule est le **statut du rapport** du jour : rouge en cours, vert en contrôle, bleu facturé. Un clic sur une cellule **ouvre le rapport**.
- Les lignes du bas totalisent les heures de travail, les absences, le total du jour et le **total de la semaine**, affiché le dimanche. Un total journalier supérieur à la journée normale est signalé en rouge.

Vacances et absences

- Cliquez sur un jour de la ligne **Vacances / absences**, ou sur le **calendrier** de la barre d'outils.
- Indiquez la période (**du ... au ...**), le **type** (vacances, maladie, accident, jour férié, école, service militaire, autre), les heures par jour, et une remarque si besoin.
- Enregistrer**. Sur une période, seuls les jours ouvrés sont pris. Pour retirer une absence, rouvrez le jour et cliquez sur **Effacer l'absence**.

Absence · Martin Pierre

Du au

Type

Heures / jour journée complète : 9 h · sur une période, seuls les jours ouvrés comptent

Remarque

Saisie d'une absence : un jour ou une période.


Valider le mois

La **coche verte** de la barre d'outils passe **en contrôle** tous les rapports du mois encore en cours où le collaborateur a des heures. Les cellules rouges deviennent vertes ; la gestion peut alors fixer les prix de régie. Un rapport validé ne peut plus être modifié par l'ouvrier.

À savoir Ces heures et absences alimenteront les synthèses annuelles par employé (heures par chantier et par mois, congés, maladie) de la prochaine livraison.

14. Utilisateurs et rôles

Menu **Administration**, réservé aux administrateurs.

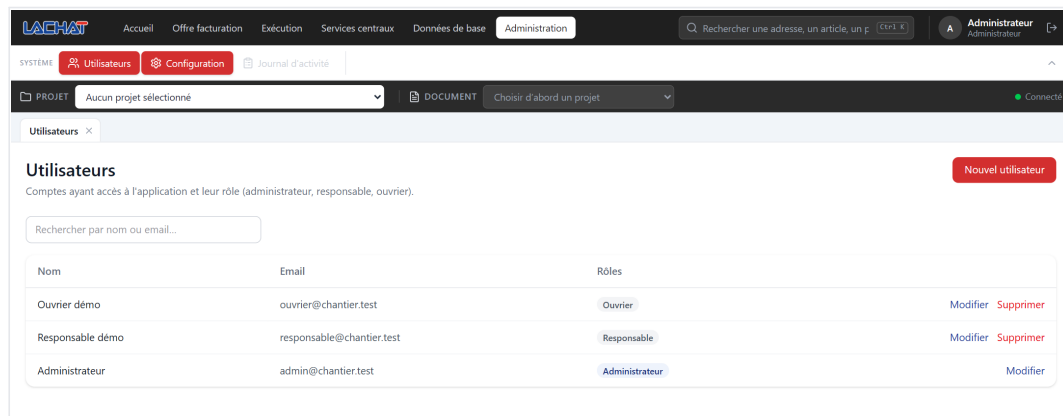


La gestion des utilisateurs.

- **Nouvel utilisateur** : nom, email, mot de passe d'au moins 8 caractères, et rôle.
- **Modifier** change le nom, l'email ou le rôle. Laissez le mot de passe vide pour le conserver.
- **Supprimer** retire l'accès. Vous ne pouvez pas supprimer votre propre compte.
- **Configuration** permet de changer le nom affiché et le logo de l'application, la majoration de régie par défaut et la durée d'une journée de travail.

Ce que voit un ouvrier

Un ouvrier consulte les projets pour retrouver son chantier, en lecture seule, et saisit ses rapports journaliers (chapitre 10). Il n'a ni recherche, ni devis, ni régie, ni adresses, ni prix.

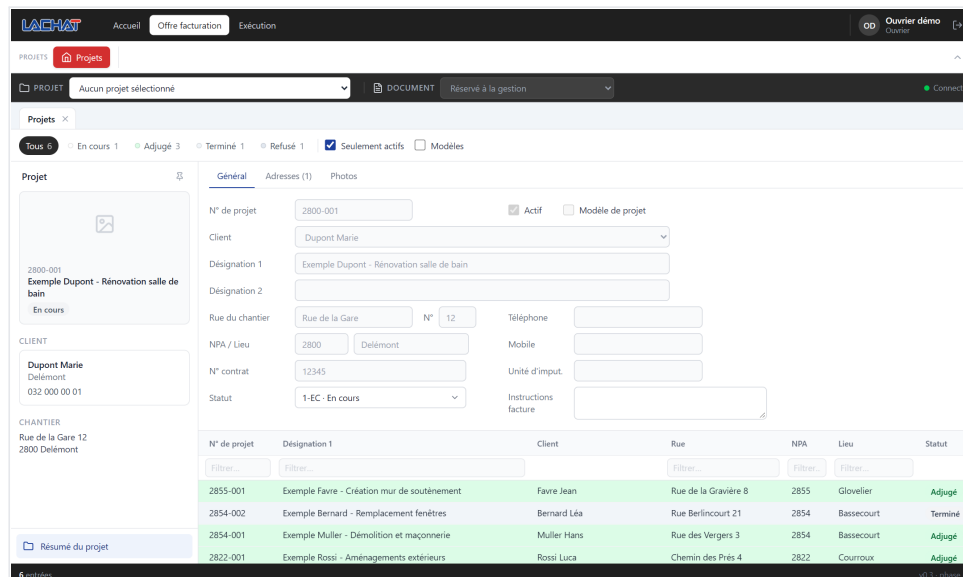

La page Projets vue par un ouvrier : pas de bouton de création, fiche verrouillée.

À savoir Chaque création, modification et suppression est enregistrée dans un journal d'activité : qui a modifié quoi, et quand. Il est particulièrement utile pour les prix.

15. Les modules à venir

Certaines pages et certains boutons sont déjà visibles mais pas encore actifs : ils sont grisés, ou signalent « disponible dans une phase ultérieure ».

Module	Contenu prévu
Factures et statistiques	Acomptes, factures, facture finale depuis les rapports validés (le statut « Facturé en régie » sera alors posé automatiquement), impression PDF ; suivi de facturation et synthèses par employé.
Reprise des données BauBit	Vos projets, clients, catalogue et prix existants.
Saisie mobile	Rapport journalier saisi sur le chantier, depuis un téléphone ou une tablette.
Temps au bureau et stocks	Compteur de temps et gestion des stocks de produits.

Ce mode d'emploi sera complété à chaque livraison.

16. Aide-mémoire

Raccourcis clavier

Touche	Effet
Ctrl + K	Place le curseur dans la recherche instantanée.
Ctrl + S	Enregistre immédiatement la fiche en cours.
Entrée (dans un devis)	Insère l'article choisi, puis passe de la quantité au prix, puis au champ d'ajout.
Entrée (grille des heures)	Enregistre la cellule et descend à la ligne suivante ; les flèches déplacent le curseur.
Entrée (régie)	Enregistre le prix modifié ; Échap annule la saisie.
Flèches haut et bas	Parcourent les résultats d'une recherche.
Échap	Referme la liste de résultats.
Tab	Passe au champ suivant.

Questions fréquentes

Question	Réponse
Je ne trouve pas le bouton Enregistrer.	Il n'est pas nécessaire : tout s'enregistre automatiquement. Vérifiez la mention « Enregistré » en bas à droite.
La liste est vide.	Un filtre est probablement actif : videz les cases « Filtrer... », vérifiez le statut choisi et « Seulement actifs ».
Je ne peux pas créer de devis.	Choisissez d'abord un projet dans la barre du haut. Les devis sont réservés aux responsables et administrateurs.
Le numéro de projet proposé ne convient pas.	Modifiez-le à la main. Deux projets ne peuvent pas porter le même numéro.
L'écran affiche « Cette page a rencontré une erreur ».	Cliquez sur Réessayer ou changez de page. Si cela se répète, notez ce que vous faisiez et contactez le support.
Un article manque dans le devis.	Créez-le à la volée depuis le champ d'ajout, puis complétez-le dans le catalogue.
La grille des heures est vide, sans colonnes.	Le rapport n'est rattaché à aucun devis avec des étapes : créez le devis, ou choisissez-le dans le champ Devis de l'en-tête.
Un ouvrier ne voit pas ses rapports.	Reliez son compte de connexion à sa fiche de collaborateur (page Collaborateurs, administrateur).
Le prix régie d'une ligne est vide.	Le collaborateur n'a pas de position régie, ou l'élément de coûts n'a ni prix régie ni coût brut. Complétez la fiche, puis réappliquez les tarifs.
Je ne peux plus modifier un prix de régie.	Le rapport est facturé. Repassez-le « en contrôle » depuis son en-tête si la facture n'est pas encore partie.

Support

Pour toute question ou anomalie, contactez votre interlocuteur Step One. Précisez la page concernée, ce que vous cherchiez à faire et, si possible, joignez une capture d'écran.

Stéphane Offreda — Step One
